

# BEIRATSSITZUNG

## STATUSBERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG - Ö

---

08.03.2021

# AGENDA

## GLASFASERAUSBAU IN INGOLSTADT

01

Ausbauplan

02

Ausbaustand

03

Ausbaukarte

04

Marketing-Aktionen

**AUSBAUPLAN**

**01**

# AUSBAUPLAN

Cluster	Bezirk	Versand GNV	Abschluss Feinplanung	Beginn Tiefbau	Abschluss Tiefbau	Beginn Akquise
Cluster 19 C	Ingolstadt Altes Westviertel	November 2019	November 2019	April 2020	Dezember 2020	Juni 2021
Cluster 22 Süd	Gerolfing Süd	II Quartal 2019	II Quartal 2019	Juli 2019	Dezember 2019	Juni 2020
Cluster 22 Nord	Gerolfing Nord	Oktober 2019	November 2019	Februar 2020	September 2020	Januar 2021

Stand Februar 2021

# AUSBAUSTAND


---

Tiefbau und Kabelbau

# 02

# AUSBAUSTAND

## TIEFBAU

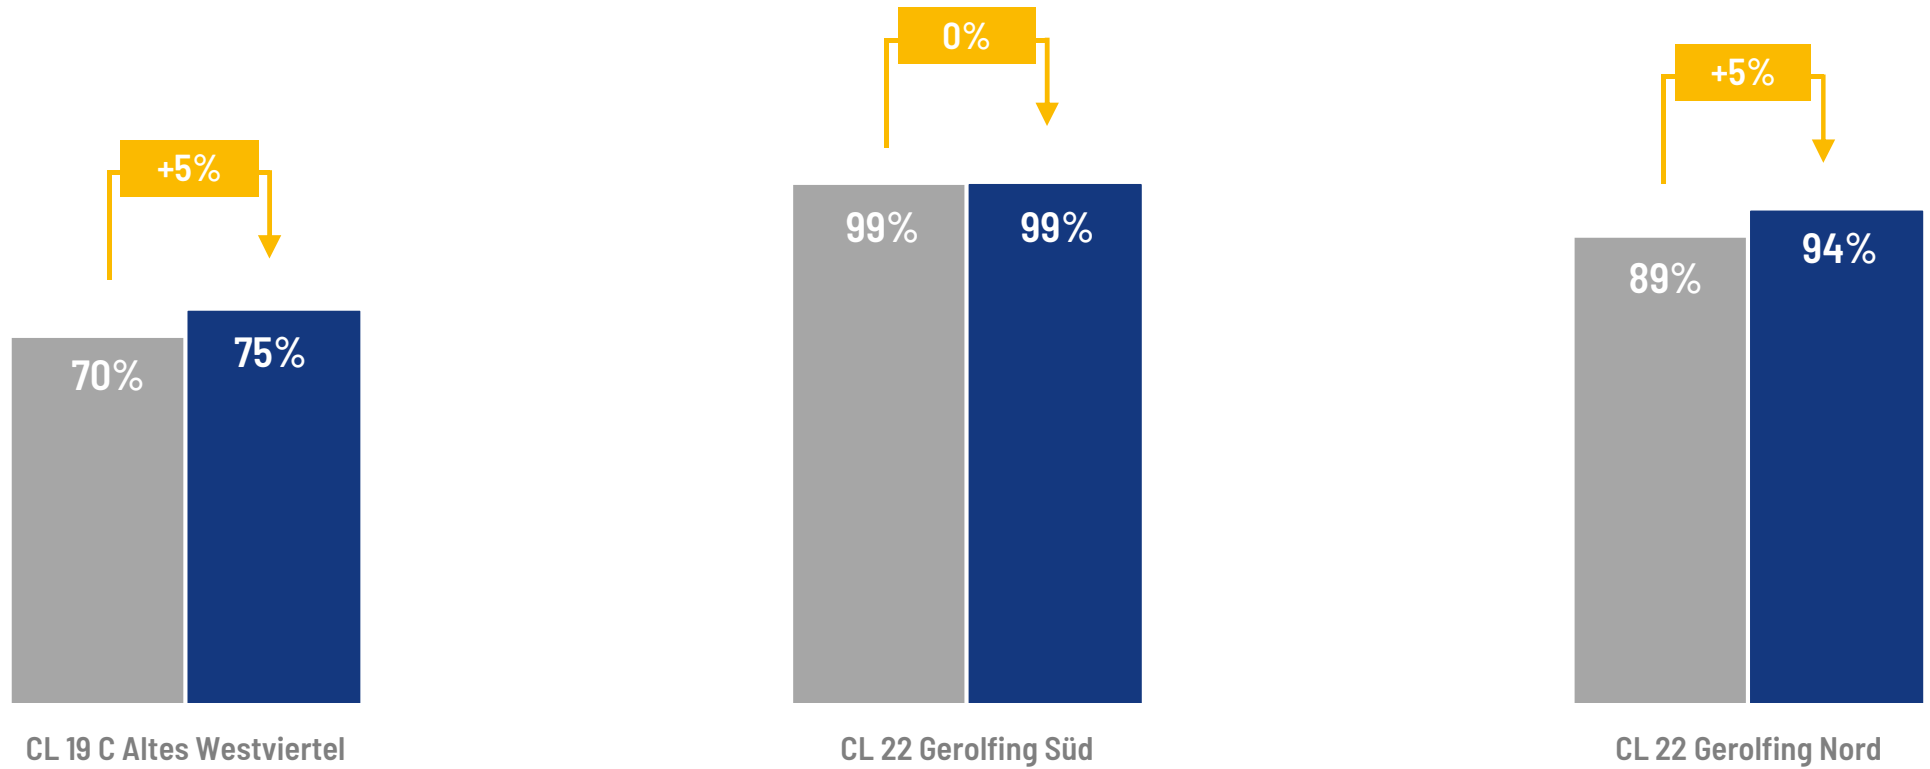


# AUSBAUSTAND


## KABELBAU



CL 19 C Altes Westviertel

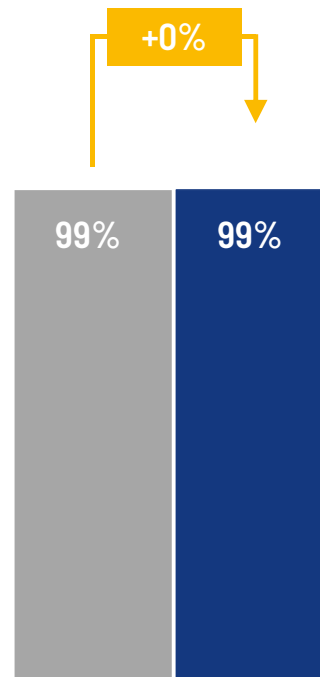

CL 22 Gerolfing Süd

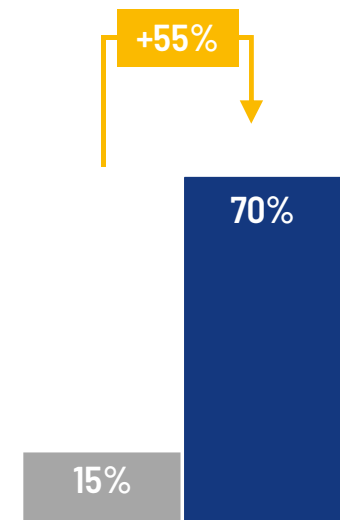

CL 22 Gerolfing Nord

■ Oktober 2020

■ Dezember 2020


**AUSBAUKARTE**

**03**



# AUSBAUKARTE

## FTTH AUSBAUGEBIET

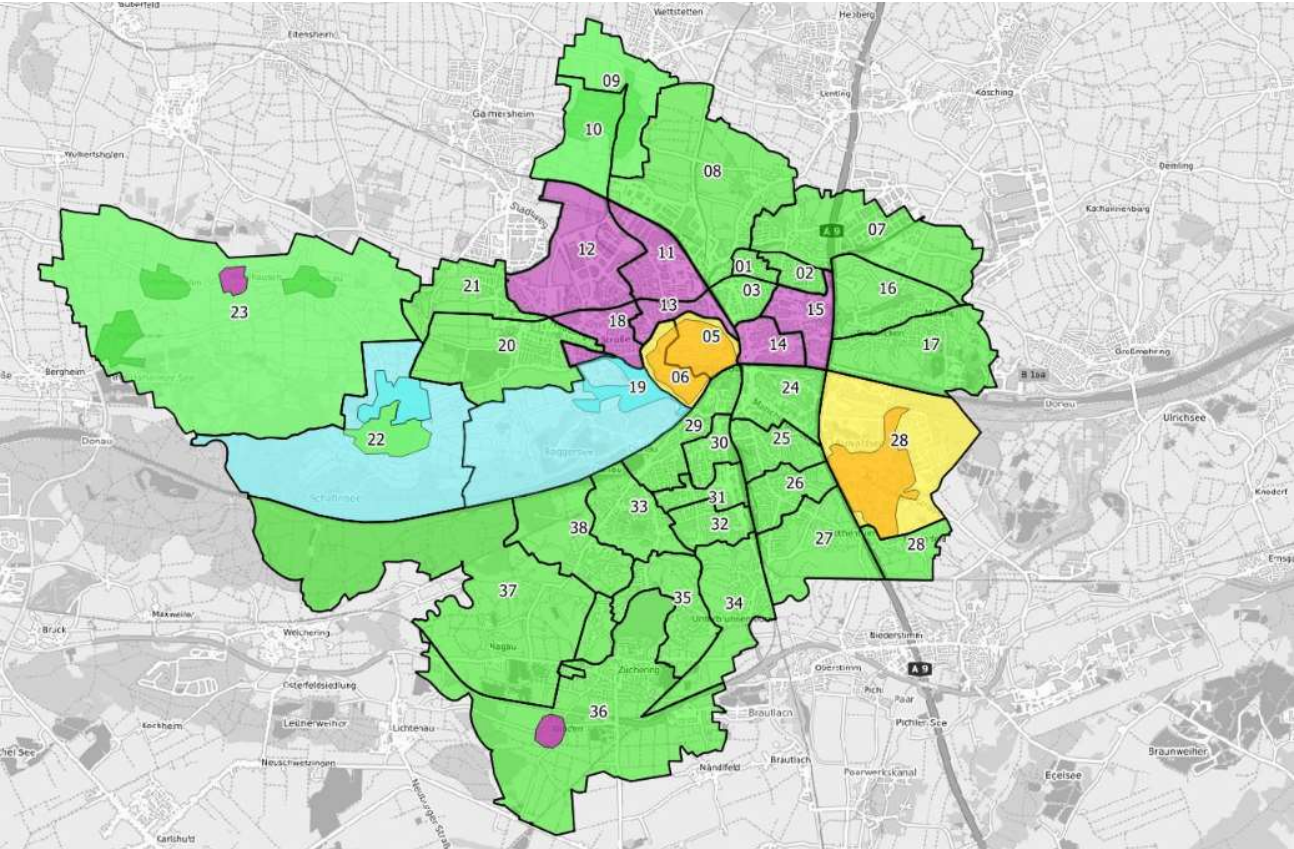

### Legende

- geplant      COM-IN
- im Bau      COM-IN
- gebaut      COM-IN
- gebaut      Telekom

Stand Februar 2021

**GEPLANTE  
MARKETING-AKTIONEN**

**04**

# MARKETING AKTIONEN 2021

## FTTH - KMU - KUNDENCENTER

- Feb/März 2021: Altes Westviertel (Vorvermarktung durch Mailing inkl. Flyer)
- März/April/Mai: Gerolfing (Mailing/Brief, Flyer, Plakatierung vor Ort)...
- 1. Halbjahr 2021: KMU aktive Akquise
- Mai - Juli: Schaufenstergestaltung Kundencenter in der Mauthstraße
- tv.ingolstadt Infomercial geplant



# MARKETING

## AUSGEWÄHLTE SPONSORINGMAßNAHMEN

- ERCI
- Kabaretttage
- LGS
- Triathlon





---

[www.comin-glasfaser.de](http://www.comin-glasfaser.de)
